【様式１－１】

木津川市橋りょう長寿命化修繕計画

令和7年3月

木津川市　建設部　管理課

1. 長寿命化修繕計画の目的


１）背景

本市が管理する橋梁は，令和6年度現在で350橋架設されている．


このうち，建設後50年を経過する橋梁は，全体の50%を占めており，20年後の令和26年度には，87%程度に増加する．

これらの高齢化を迎える橋梁群に対して，従来の対症療法型の維持管理を続けた場合，橋梁の修繕・架け替えに要する費用が増大となることが懸念される．

令和6年度
176橋
(50%)



令和26年度
303橋
(87%)



２）目的

このような背景から，より計画的な橋梁の維持管理を行い，限られた財源の中で効率的に橋梁を維持していくための取り組みが不可欠となる．

コスト縮減のためには，従来の“損傷が大きく，使用上の問題が生じた段階で対策を行う”対症療法型から，“損傷が大きくなる前に予防的な対策を行う”予防保全型へ転換を図り，橋梁の寿命を延ばす必要がある．

そこで本市では，将来的な財政負担の低減および道路交通の安全性の確保を図るために，橋梁長寿命化修繕計画を策定する．

2. 長寿命化修繕計画の対象橋梁

	一般国道	主要地方道	市道	合計
全管理橋梁数	0	0	350	350
うち計画の対象橋梁数	0	0	350	350
うちこれまでの計画策定橋梁数	0	0	343	343
うち令和6年度計画策定橋梁数	0	0	7	7

長寿命化修繕計画の対象：

・橋長が2m以上の橋梁
・外寸2m以上かつ土被り1m未満の溝橋(カルバート)

3. 健全度の把握及び日常的な維持管理に関する基本的な方針

１）健全度の把握の基本的な方針
定期点検（概略点検）や日常的な維持管理によって得られた結果に基づき，橋梁の損傷を早期に発見するとともに健全度を把握する．

２）老朽化対策における基本的な方針
橋梁諸元や環境、損傷の状況を考慮して橋梁の長寿命化を図るとともに長期的な維持管理にかかるコストの縮減を図ります。

３）日常的な維持管理に関する基本的な方針
日常パトロール等により、走行路面の状態について点検を行う．

4. 対象橋梁の長寿命化及び修繕・架替えに係る費用の縮減に関する基本的な方針

本市が管理する橋梁の中で，架設後30年以上経過した橋梁は全体の約87%を占めているため、近い将来一斉に架替時期を迎えることが予想される．したがって，計画的かつ予防的な修繕対策の実施へと転換を図り，橋梁の寿命を100 年間とすることを目標とし，修繕及び架替えに要するコストを縮減する．

5. 対象橋梁の撤去・集約に係る費用の縮減に関する基本的な方針

修繕が必要な橋梁において修繕等の費用を縮減するため、交通量や代替路の有無、橋梁の健全度を考慮した上で、集約撤去の検討を行い、2029年度（令和11年度）までに2橋に対して地元の意見を踏まえながら検討し、集約・撤去の実施を目標とする。
なお、2024年度には志天北橋と志天南橋を撤去し、志天橋に集約している。このように撤去・集約を実施することで今後5年間で約100万円の維持管理コストを縮減することを目指す。

6. 新技術の活用方針

橋梁の点検や修繕工事の実施にあたっては、新技術情報提供システム（ＮＥＴＩＳ）や点検支援性能カタログなどを参考に、新技術の活用を検討し、点検・修繕工事に係る維持管理の費用削減及び効率化を図る。
点検で修繕が必要となった橋梁（12橋）において、新技術の活用検討を行い、令和11年度までに施工単価（約20万円/橋程度）の縮減を目指す。
また、3巡目の点検について、管理施設350橋のうち、約40橋を令和6年度から令和10年度までに新技術を積極的に活用し約30万円/年程度の点検費用縮減を目指す。さらに、Dr.Bridgeなどの AI橋梁診断支援システムを活用しながら、自主点検を5橋/年行うことにより、年間約65万円の点検費用の縮減を目指す。

7. 長寿命化修繕計画の優先順位

長寿命化修繕計画の優先順位は、以下の重要性を考慮して決定する。
・定期点検の健全性の診断に基づき、健全性の低い(劣化している)橋梁を優先
・第三者被害防止の観点より、跨道橋、跨線橋を優先
・修繕の困難性を考慮し、橋長が長いものを優先

8. 計画期間

5年に1回の定期点検サイクルを踏まえ、点検間隔が明らかとなるよう計画期間は10年とする。
なお、点検結果を踏まえ、毎年、計画を更新する。


9. 対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替え時期

様式１－２による

10. 長寿命化修繕計画による効果

長寿命化修繕計画を策定する350橋について，今後40年間の事業費を比較すると，従来の対症療法型が59億円に対し，長寿命化修繕計画の実施による予防保全型が34億円となり，コスト縮減効果は25億円となる.

また，損傷に起因する通行制限等が減少し，道路の安全性・信頼性が確保される.

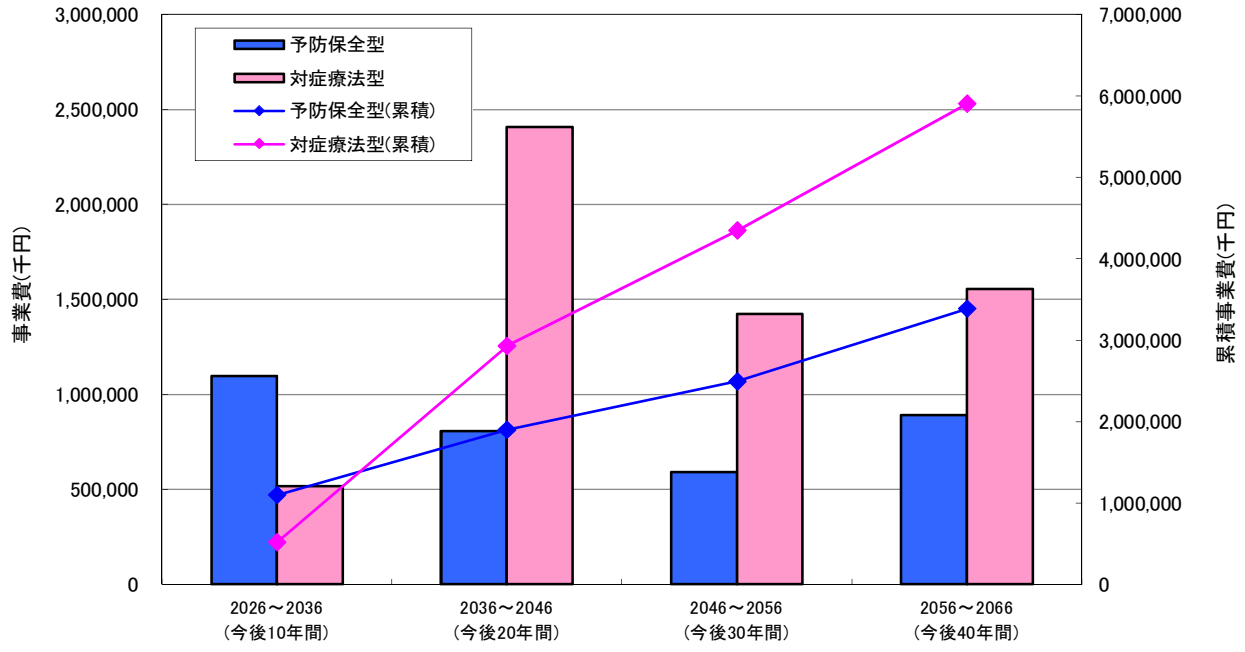

※事業費・累積事業費は見込み額

様式1-2
対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期および修繕内容・時期又は架替時期

橋梁ID	橋梁名	路線名	所在地	橋種	橋長	幅員	架設年度	最新点検年次	最新健全度	対策の内容・時期										全体事業費（概算）千円	備考
										2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035		
1	舟戸小橋	市道山140号舟戸線	山城町椿井	RC橋	2.0	6.0	1966	2024	Ⅱ				点検				対策(主桁（RC）)	点検		389	
2	長堀上橋	市道山178号小仲小路線	山城町上狛	RC橋	2.0	5.0	1964	2022	Ⅰ		点検					点検				330	
3	1027号線1号橋	市道加1027号線	加茂町例幣	その他	2.0	5.9	1961	2020	Ⅰ					点検					点検	330	
4	3043号線1号橋	市道加3043号線	加茂町兎並	PC橋	2.0	3.0	1974	2020	Ⅰ					点検					点検	330	
5	1068号線2号橋	市道加1068号線	加茂町岡崎	RC橋	2.0	2.0	1974	2020	Ⅰ					点検					点検	330	
6	2-11号線1号橋	市道加2-11号線	加茂町里薬井谷	RC橋	2.0	3.0	1992	2024	Ⅱ				点検				対策(主桁（RC）)	点検		345	
7	2027号線2号橋	市道加2027号線	加茂町大野唐岩	RC橋	2.0	5.2	1945	2024	Ⅰ				点検					点検		330	
8	1028号線1号橋	市道加1028号線	加茂町例幣	RC橋	2.0	3.3	1994	2024	Ⅱ				点検				対策(主桁（RC）)	点検		348	
9	2018号線1号橋	市道加2018号線	加茂町里須原	その他	2.1	11.3	1961	2020	Ⅰ					点検					点検	688	
10	切通橋	市道木15号切通熊ヶ崎線	鹿背山切通	その他	2.1	3.4	1925	2022	Ⅰ		点検					点検				330	
11	高座中山橋	市道木31号中山1号線	市坂中山	RC橋	2.1	5.0	1961	2024	Ⅰ				点検					点検		330	
12	宝橋	市道山179号乾町線	上狛宝本	RC橋	2.1	16.5	1977	2022	Ⅱ	対策(下部工（コンクリート）)	点検					点検				739	
13	1-7号線1号橋	市道加1-7号線	加茂町兎並	RC橋	2.1	4.0	1945	2024	Ⅱ				点検				対策(主桁（RC）)	点検		363	
14	1018号線1号橋	市道加1018号線	加茂町例幣	RC橋	2.1	4.3	1961	2024	Ⅱ				点検					点検		330	
15	2080号線2号橋	市道加2080号線	加茂町南大門	その他	2.1	5.0	1982	2024	Ⅰ				点検					点検		330	
16	灰ヶ坪橋	市道木117号大次線	木津大次	その他	2.2	2.1	1954	2022	Ⅱ		点検					点検				330	
17	1-3号線2号橋	市道加1-3号線	加茂町例幣	RC橋	2.2	4.4	1961	2024	Ⅱ				点検				対策(主桁（RC）)	点検		368	
18	1032号線1号橋	市道加1032号線	加茂町例幣	RC橋	2.2	6.0	1986	2024	Ⅰ				点検					点検		330	
19	3032号線1号橋	市道加3032号線	加茂町北	その他	2.2	2.5	1974	2024	Ⅱ	対策(下部工（コンクリート）)			点検					点検		337	
20	1022号線1号橋	市道加1022号線	加茂町例幣	その他	2.2	4.2	1961	2024	Ⅰ				点検					点検		330	
21	川尻橋	市道木117号東吐師木津線	吐師	RC橋	2.3	3.3	1960	2022	Ⅱ		点検					点検				330	
22	里橋	市道山58号東古川・里屋敷線	山城町平尾	RC橋	2.3	4.0	1945	2024	Ⅰ				点検					点検		330	
23	越中谷1号橋	市道山64号越中谷団地1号線	山城町平尾	RC橋	2.3	6.6	1970	2024	Ⅱ	対策(下部工（コンクリート）)			点検				対策(主桁（RC）)	点検		427	
24	不晴谷橋	市道山101号大平尾・神童子線	山城町神童子	RC橋	2.3	5.7	1945	2024	Ⅱ				点検					点検		330	
25	通谷橋	市道山126号上狛・神童子線	山城町神童子	RC橋	2.3	2.6	1949	2024	Ⅱ	対策(主桁（RC）)			点検					点検		420	
26	長堀下橋	市道山156号艮町北線	山城町上狛	RC橋	2.3	3.7	1964	2022	Ⅰ		点検					点検				330	
27	1023号線2号橋	市道加1023号線	加茂町例幣	RC橋	2.3	3.5	1961	2024	Ⅱ				点検				対策(主桁（RC）)	点検		358	
28	2091号線1号橋	市道加2091号線	加茂町西小	その他	2.3	7.2	1989	2024	Ⅱ				点検					点検	対策(主桁（その他）)	330	

様式1-2
対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期および修繕内容・時期又は架替時期

橋梁ID	橋梁名	路線名	所在地	橋種	橋長	幅員	架設年度	最新点検年次	最新健全度	対策の内容・時期										全体事業費（概算）千円	備考
										2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035		
29	2137号線1号橋	市道加2137号線	加茂町唐岩	その他	2.3	8.3	1989	2020	Ⅱ					点検					点検 対策(主桁（その他）)	344	
30	2136号線1号橋	市道加2136号線	加茂町大野	その他	2.3	7.3	1989	2024	Ⅰ				点検					点検		330	
31	2138号線1号橋	市道加2138号線	加茂町唐岩	その他	2.3	8.3	1989	2020	Ⅱ					点検					点検 対策(主桁（その他）)	344	
32	2019号線2号橋	市道加2019号線	加茂町里	その他	2.3	2.7	1996	2024	Ⅰ				点検					点検		330	
33	2-8号線3号橋	市道加2-8号線	加茂町大野	RC橋	2.3	3.2	1961	2024	Ⅰ				点検					点検		330	
34	南ノ橋	市道木185号瓦谷片田線	木津	その他	2.0	7.3	1973	2022	Ⅰ		点検					点検				330	
35	出垣外橋	市道木185号瓦谷片田線	木津	その他	2.4	6.0	1961	2022	Ⅱ		点検					点検				330	
36	川原田橋	市道木27号木津中ノ川線	木津池田	RC橋	2.4	4.9	1929	2022	Ⅱ		点検					点検	対策(主桁（RC）)			381	
37	宮ノ堀橋	市道木42号上戸木津線	木津宮ノ堀	RC橋	2.4	4.5	1969	2022	Ⅱ	対策(下部工（コンクリート）)	点検					点検	対策(主桁（RC）)			388	
38	北ノ谷橋	市道木260号梅谷北ノ谷線	梅谷	その他	2.4	3.2	1961	2024	Ⅰ				点検					点検		330	
40	京奈和側道3号橋	市道木510号京奈和側道1号線	市坂	その他	2.4	6.0	2001	2024	Ⅱ				点検				対策(主桁（その他）)	点検		330	
41	上垣内橋	市道山63号上垣内線	山城町平尾	その他	2.4	6.2	1945	2024	Ⅱ				点検					点検	対策(主桁（その他）)	330	
42	巽上橋	市道山173号巽町2号線	山城町上狛	RC橋	2.4	2.5	1968	2022	Ⅱ		点検					点検	対策(主桁（RC）)			342	
43	巽中橋	市道山174号巽町3号線	山城町上狛	RC橋	2.4	2.4	1945	2022	Ⅱ		点検					点検				330	
44	越中谷4号橋	市道山264号越中谷団地11号線	山城町平尾	その他	2.4	10.0	1984	2020	Ⅱ					点検					点検 対策(主桁（その他）)	344	
45	2067号線1号橋	市道加2067号線	加茂町観音寺	その他	2.4	4.9	1945	2024	Ⅱ				点検					点検		330	
46	3057号線1号橋	市道加3057号線	加茂町兎並	RC橋	2.4	3.6	1974	2024	Ⅱ	対策(下部工（コンクリート）)			点検				対策(主桁（RC）)	点検		371	
47	小谷橋	市道木33号宮の谷寺ノ下線	梅谷	RC橋	2.5	5.0	1926	2022	Ⅱ		点検					点検 対策(床版（RC）)	対策(主桁（RC）)			330	
48	小川橋	市道木69号小寺内垣外線	木津町内垣外	その他	2.5	4.0	1967	2022	Ⅱ		点検					点検			対策(主桁（その他）)	330	
49	山口橋	市道山20号渋川・山口線	綺田山際48	RC橋	2.5	10.0	1907	2020	Ⅱ					点検			対策(主桁（RC）)		点検	833	
50	淀谷上橋	市道山32号淀谷線	山城町綺田	RC橋	2.5	2.7	1932	2022	Ⅱ		点検					点検	対策(主桁（RC）)			345	
51	志天橋	市道山47号綾杉・北河原線	山城町綺田局塚14	その他	4.6	5.7	2024	2024	Ⅰ				点検					点検		506	
52	谷川4号橋	市道山126号上狛・神童子線	山城町神童子	RC橋	2.5	2.0	1949	2024	Ⅲ	対策(主桁（RC）)			点検					点検		368	
53	2-4号線2号橋	市道加2-4号線	加茂町西川端	RC橋	2.5	2.5	1961	2024	Ⅰ				点検					点検		330	
54	1014号線1号橋	市道加1014号線	加茂町井平尾	RC橋	2.5	5.0	1961	2024	Ⅱ				点検				対策(主桁（RC）)	点検		389	
55	1033号線1号橋	市道加1033号線	加茂町例幣	RC橋	2.5	3.8	1974	2024	Ⅰ				点検					点検		330	
56	1077号線1号橋	市道加1077号線	加茂町岡崎	その他	2.5	3.8	1945	2024	Ⅰ				点検					点検		330	
57	1-5号線3号橋	市道加1-5号線	加茂町北	RC橋	2.6	7.3	1974	2024	Ⅱ	対策(下部工（コンクリート）)			点検				対策(主桁（RC）)	点検		453	

様式1-2
対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期および修繕内容・時期又は架替時期

橋梁ID	橋梁名	路線名	所在地	橋種	橋長	幅員	架設年度	最新点検年次	最新健全度	対策の内容・時期										全体事業費（概算）千円	備考
										2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035		
58	上津橋	市道木42号上戸木津線	木津宮ノ堀	RC橋	2.6	4.4	1969	2022	Ⅰ		点検					点検				330	
59	京奈和側道4号橋	市道木511号京奈和側道2号線	市坂	その他	2.6	6.0	2001	2024	Ⅱ				点検				対策(主桁（その他）)	点検		330	
60	門口上橋	市道山13号小坪線	山城町綺田	RC橋	2.6	3.5	1993	2024	Ⅰ				点検					点検		330	
61	笛吹橋	市道山52号笛吹線	山城町平尾	RC橋	2.6	2.1	1974	2024	Ⅱ	対策(下部工（コンクリート）)			点検				対策(主桁（RC）)	点検		340	
62	極楽橋(山67号)	市道山67号越中谷団地4号線	山城町平尾	RC橋	2.6	4.8	1985	2024	Ⅰ				点検					点検		330	
63	芳野谷橋	市道山101号大平尾・神童子線	山城町神童子	RC橋	2.6	4.3	1967	2024	Ⅱ				点検				対策(主桁（RC）)	点検		379	
64	御幸橋	市道山192号中井戸線	山城町上狛	RC橋	2.6	4.1	1961	2024	Ⅱ				点検				対策(主桁（RC）)	点検		376	
65	1049号線1号橋	市道加1049号線	加茂町西	RC橋	2.6	4.0	1945	2024	Ⅱ				点検				対策(主桁（RC）)	点検		371	
66	2093号線4号橋	市道加2093号線	加茂町東小上	RC橋	2.6	2.0	1996	2024	Ⅰ				点検					点検		330	
67	1068号線3号橋	市道加1068号線	加茂町岡崎	RC橋	2.6	3.9	1990	2024	Ⅱ				点検				対策(主桁（RC）)	点検		368	
68	宮ノ谷橋(木33号)	市道木33号宮の谷寺ノ下線	梅谷髯谷	RC橋	2.7	5.7	1962	2022	Ⅱ		点検					点検	対策(主桁（RC）)			405	
69	淀谷2号橋	市道山32号淀谷線	山城町綺田	RC橋	2.7	2.5	1945	2024	Ⅰ				点検					点検		330	
70	立ヶ尻橋	市道木43号西垣外加茂線	鹿背山	RC橋	2.8	3.5	1934	2022	Ⅱ		点検					点検				330	
71	門口下橋	市道山1号藪浦・渋川線	綺田藪浦21-1	その他	2.8	12.8	1997	2020	Ⅱ				対策(主桁（その他）)	点検					点検	688	
72	三所塚橋	市道山62号三所塚・中溝線	山城町平尾	RC橋	2.8	5.5	1974	2024	Ⅱ	対策(下部工（コンクリート）)			点検				対策(主桁（RC）)	点検		420	
73	1-3号線1号橋	市道加1-3号線	加茂町例幣	RC橋	2.8	4.5	1961	2024	Ⅱ				点検				対策(主桁（RC）)	点検		387	
74	2093号線1号橋	市道加2093号線	加茂町東小下	その他	2.8	3.2	1986	2024	Ⅱ	対策(下部工（コンクリート）)			点検					点検		457	
75	2093号線2号橋	市道加2093号線	加茂町東小上	その他	2.8	2.8	1961	2024	Ⅱ				点検					点検	対策(主桁（その他）)	330	
76	3058号線1号橋	市道加3058号線	加茂町北	RC橋	2.8	4.6	1961	2024	Ⅱ				点検				対策(主桁（RC）)	点検		389	
77	野田下橋	市道山10号神ノ木・渋川線	浦田山城町綺田	RC橋	2.8	3.5	1998	2024	Ⅱ	対策(主桁（RC）)			点検					点検		366	
78	谷川2号橋	市道山125号椿井・大谷線	山城町椿井	RC橋	2.9	3.0	1977	2024	Ⅱ				点検				対策(主桁（RC）)	点検		358	
79	1070号線2号橋	市道加1070号線	加茂町岡崎	RC橋	2.9	6.5	1922	2024	Ⅱ				点検				対策(主桁（RC）)	点検		428	
80	3056号線3号橋	市道加3056号線	加茂町南下手	RC橋	2.9	3.3	1974	2024	Ⅰ				点検					点検		330	
81	中ノ谷橋	市道木33号宮の谷寺ノ下線	梅谷	鋼橋	3.0	4.6	1965	2022	Ⅱ		点検					点検 対策(床版（RC）)	対策(主桁（鋼）)			1,317	
82	綺原川上橋	市道山24号浜・山際線	山城町綺田	RC橋	3.0	2.2	1955	2024	Ⅱ				点検				対策(主桁（RC）)	点検		342	
83	淀村橋	市道山34号山口・山ノ上線	山城町綺田	RC橋	3.0	7.5	1922	2024	Ⅲ	対策(主桁（RC）)			点検					点検		1,069	
85	長坂橋	市道加2-13号線	加茂町南下手長坂	その他	3.0	7.1	1986	2021	Ⅰ	点検					点検					330	
86	2093号線3号橋	市道加2093号線	加茂町東小上	その他	3.0	2.6	1961	2024	Ⅲ	対策(下部工（コンクリート）)			点検					点検		433	

様式1-2
対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期および修繕内容・時期又は架替時期

橋梁ID	橋梁名	路線名	所在地	橋種	橋長	幅員	架設年度	最新点検年次	最新健全度	対策の内容・時期										全体事業費（概算）千円	備考
										2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035		
87	長城橋	市道木823号梅美台松谷線	市坂松谷	RC橋	3.1	3.1	1922	2022	Ⅰ		点検					点検				330	
88	西町橋	市道木103号小寺五丁目線	木津八ヶ坪51-1	RC橋	3.1	13.6	1945	2020	Ⅱ					点検			対策(主桁（RC）)		点検	952	
89	水干橋	市道木103号門樋・水干線	市坂	その他	3.1	3.5	1981	2022	Ⅱ		点検					点検			対策(主桁（その他）)	483	
90	明官橋	市道山187号的場線	山城町上狛	RC橋	3.1	4.0	1922	2024	Ⅱ				点検				対策(主桁（RC）)	点検		381	
91	越中谷6号橋	市道山62号三所塚・中溝線	山城町平尾中垣内	RC橋	3.1	6.6	2006	2022	Ⅰ		点検					点検				330	
92	2068号線2号橋	市道加2068号線	加茂町観音寺	RC橋	3.1	4.2	1984	2024	Ⅰ				点検					点検		330	
93	2041号線2号橋	市道加2041号線	加茂町大野	RC橋	3.1	3.3	1988	2024	Ⅰ				点検					点検		330	
94	3091号線1号橋	市道加3091号線	加茂町南下手	RC橋	3.1	3.0	1989	2024	Ⅱ				点検				対策(主桁（RC）)	点検		361	
95	淀谷1号橋	市道山31号山口・東光寺谷線	山城町綺田	RC橋	3.2	3.8	1945	2024	Ⅱ				点検				対策(主桁（RC）)	点検		379	
96	越中谷5号橋	市道山264号越中谷団地11号線	山城町平尾	RC橋	3.2	6.0	1998	2024	Ⅰ	対策(主桁（RC）)			点検					点検		428	
97	2111号線1号橋	市道加2111号線	加茂町尻枝	RC橋	3.2	3.0	1982	2024	Ⅱ				点検				対策(主桁（RC）)	点検		361	
98	3063号線1号橋	市道加3063号線	加茂町森相坂	RC橋	3.2	4.1	1961	2022	Ⅱ		点検					点検				330	
99	西教寺橋	市道木43号西垣外加茂線	木津雲村	RC橋	3.3	4.5	1945	2022	Ⅰ		点検					点検				330	
100	巽下橋	市道山176号巽町5号線	山城町上狛野日向	RC橋	3.3	3.3	1977	2022	Ⅰ		点検					点検				330	
101	上瓦谷橋	市道木104号瓦谷5号線	木津町宮ノ内	その他	3.4	2.4	1927	2022	Ⅱ		点検					点検 対策(床版（RC）)			対策(主桁（その他）)	310	
102	無名橋	市道木115号瓦谷大次線	木津	その他	3.4	4.6	1988	2022	Ⅱ		点検					点検			対策(主桁（その他）)	330	
103	西ノ口南橋	市道山189号西線	大字上狛小字南荒堀1-4	RC橋	3.4	8.7	1961	2020	Ⅱ					点検			対策(主桁（RC）)		点検	861	
104	萩ノ谷橋	市道山168号茶屋前・浜屋敷線	山城町平尾	RC橋	3.4	6.0	1961	2024	Ⅰ				点検					点検		330	
105	2100号線1号橋	市道加2100号線	加茂町辻	その他	3.4	2.9	1986	2024	Ⅱ				点検					点検	対策(主桁（その他）) 対策(下部工（コンクリート）)	337	
106	綺原川中橋	市道山26号出垣外・内垣外線	山城町綺田	RC橋	3.5	3.2	1955	2024	Ⅰ				点検					点検		330	
107	正天2号橋	市道山36号内垣外・南河原線	山城町綺田	RC橋	3.5	3.4	1977	2024	Ⅱ				点検				対策(主桁（RC）)	点検		376	
108	鶴橋	市道山122号内畑・畑岡線	山城町北河原	RC橋	3.5	3.1	1954	2024	Ⅱ				点検					点検		330	
109	3059号線1号橋	市道加3059号線	加茂町北	RC橋	3.5	6.4	1974	2024	Ⅰ				点検					点検		330	
110	渡り戸橋	市道山1号藪浦・渋川線	山城町綺田	RC橋	3.6	3.1	1932	2024	Ⅲ	対策(下部工（コンクリート）)			点検				対策(主桁（RC）)	点検		495	
111	大谷2号橋	市道山105号大谷線	上狛大谷68	RC橋	3.6	2.6	1945	2024	Ⅰ				点検					点検		330	
112	瓶原橋	市道加1-1号線	加茂町奥畑	RC橋	3.6	4.0	1961	2024	Ⅱ				点検				対策(主桁（RC）)	点検		392	
113	3058号線2号橋	市道加3058号線	加茂町高去ヲイズ	RC橋	3.6	4.1	1961	2022	Ⅱ		点検					点検	対策(主桁（RC）)			394	
114	2041号線1号橋	市道加2041号線	加茂町大野山際	RC橋	3.6	2.9	1985	2022	Ⅰ		点検					点検				330	

対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期および修繕内容・時期又は架替時期

橋梁ID	橋梁名	路線名	所在地	橋種	橋長	幅員	架設年度	最新点検年次	最新健全度	対策の内容・時期										全体事業費（概算）千円	備考
										2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035		
115	1017号線1号橋	市道加1017号線	加茂町井平尾岩脇	RC橋	3.6	2.4	1989	2024	Ⅱ				点検					点検		330	
116	西殿橋	市道山179号乾町線	大字上狛小字西殿19-1	RC橋	3.7	4.4	1961	2024	Ⅱ				点検					点検		330	
117	坤橋	市道山180号坤町線	上狛西浦代	RC橋	3.7	3.3	1971	2022	Ⅱ	対策(下部工（コンクリート）)	点検					点検	対策(主桁（RC）)			389	
118	坤町東橋	市道山183号坤町東線	上狛坤町1-1	RC橋	3.7	5.6	1970	2022	Ⅱ	対策(下部工（コンクリート）)	点検					点検				345	
119	奥谷橋	市道加1-1号線	加茂町奥畑	RC橋	3.7	4.1	1956	2024	Ⅱ				点検				対策(主桁（RC）)	点検		400	
120	1-3号線3号橋	市道加1-3号線	加茂町例幣	RC橋	3.7	5.8	1961	2024	Ⅱ				点検					点検		330	
121	2-4号線1号橋	市道加2-4号線	加茂町西	RC橋	3.7	4.2	1961	2024	Ⅱ				点検				対策(主桁（RC）)	点検		402	
122	2081号線1号橋	市道加2081号線	加茂町高田	RC橋	3.7	3.4	1961	2024	Ⅰ				点検					点検		330	
123	2124号線1号橋	市道加2124号線	加茂町里西鳥口	その他	3.7	9.0	1988	2020	Ⅰ					点検					点検	688	
124	2125号線1号橋	市道加2125号線	加茂町里西鳥口	その他	3.7	9.0	1988	2020	Ⅰ					点検					点検	688	
125	赤橋	市道木22号下梅谷観音寺線	鹿背山清水谷4	その他	3.8	3.2	1927	2021	Ⅱ	点検	対策(ゴム製支承)				点検				対策(主桁（その他）)	1,168	
126	札場橋	市道木27号木津中ノ川線	梅谷北ノ谷29	RC橋	3.8	4.7	1967	2021	Ⅱ	点検					点検		対策(主桁（RC）)			415	
127	綺原川下橋	市道山27号出垣外・局塚線	綺田出垣外96	RC橋	3.8	2.6	1956	2021	Ⅰ	点検					点検					330	
128	坂下橋	市道山127号椿井・中道線	大字椿井小字安ノ平2-1	RC橋	3.8	4.5	1977	2021	Ⅱ	点検 対策(下部工（コンクリート）)					点検					177	
129	2-5号線1号橋	市道加2-5号線	加茂町岡崎	RC橋	3.8	10.5	1922	2021	Ⅰ	点検					点検					688	
130	3054号線2号橋	市道加3054号線	加茂町兎並砂垣	その他	3.8	2.1	1986	2021	Ⅱ	点検					点検				対策(主桁（その他）)	330	
131	3056号線2号橋	市道加3056号線	加茂町兎並砂垣	RC橋	3.8	4.3	1961	2021	Ⅱ	点検					点検		対策(主桁（RC）)			405	
132	2122号線1号橋	市道加2122号線	加茂町高田京内	その他	3.8	5.7	1991	2021	Ⅰ	点検					点検					330	
133	光明仙上橋	市道山19号綺田・奥山線	綺田光明仙113-1	RC橋	3.9	3.2	1974	2021	Ⅱ	点検 対策(下部工（コンクリート）)					点検		対策(主桁（RC）)			221	
134	落辺橋(RC)	市道山180号坤町線	上狛落辺35	RC橋	3.9	3.0	1973	2021	Ⅱ	点検					点検		対策(主桁（RC）)			371	
135	落辺橋(鋼)	市道山180号坤町線	上狛落辺35	鋼橋	3.9	1.4	1973	2021	Ⅱ	点検					点検		対策(主桁（鋼）)			843	
136	的場橋	市道山181号大里西線	上狛坤町46	RC橋	3.9	3.7	1970	2021	Ⅱ	点検 対策(下部工（コンクリート）)					点検		対策(主桁（RC）)			237	
137	2-4号線3号橋	市道加2-4号線	加茂町河原	RC橋	3.9	6.7	1945	2021	Ⅰ	点検					点検					330	
138	1023号線3号橋	市道加1023号線	加茂町例幣金ケ辻	RC橋	3.9	2.8	1967	2021	Ⅱ	点検					点検		対策(主桁（RC）)			368	
139	谷川3号橋	市道山125号椿井・大谷線	椿井野田尾72	RC橋	4.0	3.4	1949	2021	Ⅱ	点検					点検		対策(主桁（RC）)			387	
140	1-4号線1号橋	市道加1-4号線	加茂町岡崎	その他	4.0	6.3	1984	2021	Ⅱ	点検					点検				対策(主桁（その他）)	330	
141	1-4号線3号橋	市道加1-4号線	加茂町岡崎	RC橋	4.0	7.6	1945	2021	Ⅱ	点検					点検		対策(主桁（RC）)			506	
142	2084号線1号橋	市道加2084号線	加茂町高田濁池	RC橋	4.0	2.7	1945	2021	Ⅱ	点検					点検		対策(主桁（RC）)			366	

様式1-2
対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期および修繕内容・時期又は架替時期

橋梁ID	橋梁名	路線名	所在地	橋種	橋長	幅員	架設年度	最新点検年次	最新健全度	対策の内容・時期										全体事業費（概算）千円	備考
										2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035		
143	3068号線1号橋	市道加3068号線	加茂町南下手	RC橋	4.0	3.7	1990	2021	Ⅰ	点検					点検					330	
144	南河原橋	市道山36号内垣外・南河原線	綺田正天70	RC橋	4.1	2.3	1956	2017	Ⅱ		点検					点検	対策(主桁（RC）)			531	
145	宮ノ谷橋(加1-1号)	市道加1-1号線	梅谷北中ノ谷70-1	RC橋	4.1	4.2	1956	2021	Ⅱ	点検					点検		対策(主桁（RC）)			413	
146	3056号線1号橋	市道加3056号線	加茂町兎並砂垣	RC橋	4.1	3.7	1974	2021	Ⅰ	点検					点検					330	
147	1-1号線2号橋	市道加1-1号線	加茂町例幣	RC橋	4.2	7.6	1961	2021	Ⅰ	点検					点検					330	
148	文廻橋	市道木27号木津中ノ川線	木津馬場南30	RC橋	4.3	3.6	1961	2021	Ⅰ	点検					点検					330	
149	乾橋	市道山179号乾町線	大字上狛小字西浦代7-1	RC橋	4.4	3.7	1972	2021	Ⅱ	点検 対策(下部工（コンクリート）)					点検		対策(主桁（RC）)			247	
150	黒部橋	市道山75号城垣内線	山城町平尾城垣内35	その他	4.4	6.5	2007	2021	Ⅰ	点検					点検					330	
151	2-3号線1号橋	市道加2-3号線	加茂町例幣	RC橋	4.4	5.2	2008	2021	Ⅰ	点検					点検				対策(主桁（RC）)	449	
152	2106号線1号橋	市道加2106号線	加茂町辻大谷川	RC橋	4.4	4.0	1961	2021	Ⅱ	点検					点検					330	
153	1-2号線3号橋	市道加1-2号線	加茂町例幣東	RC橋	4.4	3.7	1986	2021	Ⅱ	点検					点検		対策(主桁（RC）)			402	
154	上梅谷橋	市道木261号梅谷中ノ島北ノ谷線	梅谷中ノ島45-2	鋼橋	4.5	4.6	1950	2021	Ⅱ	点検					点検	対策(床版（RC）)	対策(主桁（鋼）)			2,055	
155	正天1号橋	市道山35号山口・中古川線	綺田内垣外66	RC橋	4.5	4.4	1977	2021	Ⅱ	点検 対策(下部工（コンクリート）)					点検		対策(主桁（RC）)			275	
156	前田橋	市道山79号東古川・米出し線	平尾小字前田34-2	RC橋	4.5	8.5	1997	2021	Ⅰ	点検					点検					688	
157	2087号線1号橋	市道加2087号線	加茂町西小	RC橋	4.5	3.5	1922	2021	Ⅱ	点検					点検		対策(主桁（RC）)			400	
158	2089号線1号橋	市道加2089号線	加茂町西小スコ谷	RC橋	4.5	2.4	1986	2021	Ⅱ	点検					点検		対策(主桁（RC）)		対策(下部工（コンクリート）)	371	
159	南後背橋(木91号)	市道木91号鹿背山北之庄線	木津南後背1-92	その他	4.6	8.3	1990	2021	Ⅱ	点検					点検				対策(主桁（その他）)	688	
160	不二第三号橋	市道木296号不二荘園2号線	木津神田6-120	RC橋	4.6	6.2	1975	2021	Ⅱ	点検 対策(下部工（コンクリート）)					点検		対策(主桁（RC）)			341	
161	2119号線1号橋	市道加2119号線	加茂町南大門ミドロ	RC橋	4.6	3.0	1985	2021	Ⅰ	点検					点検					330	
162	第二円度橋	市道木186号南後背大里線	木津南後背65	PC橋	4.7	6.6	1960	2021	Ⅰ	点検					点検					330	
163	不二第一号橋	市道木296号不二荘園2号線	木津神田6-39	RC橋	4.7	6.0	1975	2021	Ⅱ	点検 対策(下部工（コンクリート）)					点検		対策(主桁（RC）)			338	
164	不二第二号橋	市道木295号不二荘園1号線	木津神田6-74	RC橋	4.7	7.0	1975	2021	Ⅱ	点検 対策(下部工（コンクリート）)					点検		対策(主桁（RC）)			374	
165	大和橋	市道山47号綾杉・北河原線	大字北河原小字鶴面104	RC橋	4.7	3.2	1955	2021	Ⅰ	点検					点検					330	
166	2-1号線1号橋	市道加2-1号線	加茂町奥畑	RC橋	4.7	3.9	1961	2021	Ⅱ	点検					点検		対策(主桁（RC）)			415	
167	三枡橋	市道木103号小寺五丁目線	木津町	その他	4.8	5.4	1965	2021	Ⅰ	点検					点検					330	
168	1-2号線1号橋	市道加1-2号線	加茂町西	RC橋	4.8	5.1	1922	2021	Ⅰ	点検					点検					330	
169	大谷1号橋	市道山105号大谷線	上狛大谷180	RC橋	5.0	2.5	1945	2021	Ⅱ	点検					点検		対策(主桁（RC）)			376	
170	1052号線1号橋	市道加1052号線	加茂町河原長ヲサ	RC橋	5.1	2.0	1961	2021	Ⅱ	点検					点検		対策(主桁（RC）)			632	

様式1-2
対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期および修繕内容・時期又は架替時期

橋梁ID	橋梁名	路線名	所在地	橋種	橋長	幅員	架設年度	最新点検年次	最新健全度	対策の内容・時期										全体事業費（概算）千円	備考
										2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035		
171	1048号線1号橋	市道加1048号線	加茂町西出口	RC橋	5.1	4.7	2003	2021	Ⅱ	点検					点検					604	
172	2085号線1号橋	市道加2085号線	加茂町西小	RC橋	5.2	2.2	1961	2021	Ⅲ	点検 対策(下部工（コンクリート）)					点検					253	
173	岡崎橋	市道加2-5号線	加茂町岡崎	RC橋	5.3	3.6	1922	2021	Ⅱ	点検					点検		対策(主桁（RC）)			423	
174	東池田橋	市道木76号内垣外内田山線	木津上戸28	RC橋	5.4	3.1	1932	2021	Ⅲ	点検 対策(下部工（コンクリート）)					点検	対策(コア抜き支承) 対策(床版（RC）)	対策(主桁（RC）)			1,113	
175	2111号線2号橋	市道加2111号線	加茂町辻六反田	RC橋	3.0	3.0	1982	2024	Ⅲ	対策(主桁（RC）) 対策(下部工（コンクリート）)			点検					点検		632	
176	2019号線1号橋	市道加2019号線	加茂町大野ウヅ	RC橋	5.5	3.3	1989	2021	Ⅱ	点検					点検					604	
177	大井手橋	市道木57号市坂鹿背山線	鹿背山	RC橋	5.8	3.3	1940	2024	Ⅰ				点検					点検		786	
178	ご幸橋	市道木100号八ヶ坪3号線	木津八ヶ坪16-3	RC橋	5.8	7.1	1982	2021	Ⅱ	点検					点検 対策(下部工（コンクリート）)					322	
179	京橋(加1-2号)	市道加1-2号線	加茂町例幣市場	鋼橋	5.8	4.6	1926	2020	Ⅱ					点検			対策(主桁（鋼）)		点検	2,254	
180	神田橋	市道木185号瓦谷片田線	木津神田6	PC橋	5.9	6.8	1979	2021	Ⅰ	点検					点検					604	
181	五反田橋	市道木114号八ヶ坪西小林線	木津八ヶ坪9-1	RC橋	5.9	4.6	1980	2021	Ⅰ	点検					点検					604	
182	南後背橋(木335号)	市道木335号木津山田川線	木津南後背171	RC橋	6.0	5.7	1959	2021	Ⅱ	点検					点検	対策(床版（RC）)				1,502	
183	渋川墓橋	市道山3号鳥居・墓線	綺田渋川30	RC橋	6.0	3.1	1977	2021	Ⅱ	点検					点検		対策(主桁（RC）)			689	
184	2109号線1号橋	市道加2109号線	加茂町尻枝	RC橋	6.3	4.0	1961	2021	Ⅱ	点検					点検	対策(床版（RC）)	対策(主桁（RC）)			1,319	
185	塩田橋	市道木466号鹿背山宮ノ裏線	鹿背山	RC橋	6.4	4.6	1984	2023	Ⅰ			点検					点検			604	
186	泉川第一号橋	市道木306号泉川団地1号線	木津町	RC橋	6.4	12.7	1977	2023	Ⅲ	対策(主桁（RC）) 対策(下部工（コンクリート）)		点検				対策(床版（RC）)	点検			6,793	
187	橋本橋	市道木66号南垣外雲村線	木津雲村36-1	PC橋	6.5	2.7	1969	2021	Ⅰ	点検					点検					604	
188	相谷川1号橋	市道山273号相谷幹線	平尾峯山56	RC橋	6.5	7.2	1992	2021	Ⅰ	点検					点検					604	
189	本橋	市道木64号殿城灯篭寺線	木津雲村61-1	PC橋	6.7	6.1	1969	2021	Ⅰ	点検					点検					604	
190	分校橋	市道木32号中ノ平線	梅谷中ノ坪1	RC橋	6.8	6.2	2011	2021	Ⅰ	点検					点検					604	
191	1-10号線1号橋	市道加1-10号線	加茂町観音寺南貝戸	RC橋	6.8	4.0	1945	2021	Ⅰ	点検					点検					604	
192	下柳橋	市道山141号伊賀落・柳田線	大字椿井小字伊賀落60	RC橋	6.9	3.1	1976	2021	Ⅱ	点検 対策(下部工（コンクリート）)					点検		対策(主桁（RC）)			418	
193	林橋	市道山149号向林線	大字上狛小字柘榴垣内4	RC橋	6.9	3.3	1977	2021	Ⅱ	点検 対策(下部工（コンクリート）)					点検					312	
194	大智寺橋	市道木65号雲村池田線	木津雲村41	PC橋	7.0	3.3	1967	2021	Ⅰ	点検					点検					604	
195	イバラ谷橋	市道木494号木津中ノ川バイパス2号線	梅谷身増57	RC橋	7.0	7.2	1997	2021	Ⅰ	点検					点検					604	
196	舟戸橋	市道山140号舟戸線	山城町椿井	その他	7.0	6.9	1976	2021	Ⅰ	点検					点検					604	
197	上柳橋	市道山146号鳥井・柳田線	椿井小字伊賀落41-2	PC橋	7.0	8.7	1990	2021	Ⅰ	点検					点検					768	
198	2043号線1号橋	市道加2043号線	加茂町大野	RC橋	7.0	2.1	1922	2023	Ⅰ			点検					点検			1,230	

様式1-2
対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期および修繕内容・時期又は架替時期

橋梁ID	橋梁名	路線名	所在地	橋種	橋長	幅員	架設年度	最新点検年次	最新健全度	対策の内容・時期										全体事業費（概算）千円	備考
										2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035		
199	2-1号線2号橋	市道加2-1号線	加茂町奥畑	RC橋	7.1	4.1	1961	2021	Ⅱ	点検					点検	対策(床版（RC）)	対策(主桁（RC）)			1,517	
200	柳原橋	市道加2080号線	加茂町高田脇田	PC橋	9.2	4.2	2022	2024	Ⅰ				点検					点検		604	
201	門樋橋	市道木91号鹿背山北之庄線	木津町	RC橋	7.5	8.5	1922	2023	Ⅱ			点検					点検			768	
202	水垣内橋	市道山133号西垣内・水垣内線	大字椿井小字堂垣内19-1	RC橋	7.5	4.5	1977	2021	Ⅱ	点検					点検		対策(主桁（RC）)			801	
203	谷川1号橋	市道山125号椿井・大谷線	山城町神童子	RC橋	7.6	3.0	1967	2021	Ⅰ	点検					点検					604	
204	平ノ外橋	市道山6号地獄谷線	山城町綺田	PC橋	7.7	7.2	2013	2021	Ⅱ	点検					点検	対策(床版（PC）)				933	
205	土ヶ橋	市道加2-8号線	加茂町北下手	RC橋	7.7	6.7	1961	2021	Ⅱ	点検					点検	対策(床版（RC）)	対策(主桁（RC）)			1,260	
206	1023号線1号橋	市道加1023号線	加茂町例幣金ケ辻	RC橋	7.7	5.0	1961	2021	Ⅰ	点検					点検					604	
207	1068号線1号橋	市道加1068号線	加茂町岡崎中縄手	RC橋	7.9	3.5	1984	2021	Ⅰ	点検					点検					604	
208	相谷中橋	市道山273号相谷幹線	平尾峯山112	RC橋	8.2	8.5	1993	2021	Ⅰ	点検					点検					768	
209	3054号線1号橋	市道加3054号線	加茂町美浪椚	鋼橋	8.2	2.3	1961	2021	Ⅱ	点検					点検		対策(主桁（鋼）)			1,771	
210	1-3号線4号橋	市道加1-3号線	加茂町例幣	RC橋	8.7	6.0	2010	2021	Ⅰ	点検					点検					604	
211	岸ノ浦橋	市道山96号岸ノ浦線	大字平尾小字南払戸48-2	PC橋	8.8	5.2	1991	2021	Ⅱ	点検					点検					604	
212	西口橋	市道山97号柿ノ木・西口線	平尾西口12	RC橋	8.8	3.0	2000	2021	Ⅰ	点検					点検					604	
213	3031号線1号橋	市道加3031号線	加茂町兎並内垣外	鋼橋	9.0	1.2	2008	2021	Ⅱ	点検					点検 対策(床版（RC）)		対策(主桁（鋼）)			1,201	
214	念仏戸橋	市道山79号東古川・米出し線	平尾小字岸ノ浦82-2	PC橋	9.1	6.0	1989	2021	Ⅰ	点検					点検					604	
215	小島橋	市道山82号西古川・市姫橋	平尾小字綾杉河原43	PC橋	9.1	5.0	1988	2021	Ⅰ	点検					点検					604	
216	黒岩橋	市道山19号綺田・奥山線	綺田黒岩1-3	PC橋	9.9	3.7	1978	2021	Ⅱ	点検	対策(下部工（コンクリート）)				点検	対策(床版（PC）)	対策(主桁（PC）)			1,197	
217	硫黄の谷橋	市道山19号綺田・奥山線	吐師宮ノ前59-3	PC橋	10.0	3.6	1978	2021	Ⅱ	点検	対策(下部工（コンクリート）)				点検	対策(床版（PC）)	対策(主桁（PC）)			1,199	
218	峯山橋	市道山50号平尾・奥山線	平尾初谷100	PC橋	10.0	2.7	1970	2021	Ⅱ	点検 対策(下部工（コンクリート）)					点検	対策(床版（PC）)	対策(主桁（PC）)			809	
219	相谷下橋	市道山273号相谷幹線	井手	PC橋	10.1	7.2	1998	2023	Ⅰ			点検					点検			860	
220	淀谷橋	市道山32号淀谷線	綺田淀谷9-3	RC橋	10.1	3.7	1999	2021	Ⅰ	点検					点検					604	
221	2118号線1号橋	市道加2118号線	加茂町高田柿ノ本	鋼橋	10.3	2.5	1974	2021	Ⅱ	点検 対策(鋼製支承) 対策(下部工（コンクリート）)					点検		対策(主桁（鋼）)			5,808	
222	1070号線1号橋	市道加1070号線	加茂町岡崎中縄手	PC橋	10.4	6.0	1984	2021	Ⅱ	点検					点検	対策(床版（PC）)	対策(主桁（PC）)			1,371	
223	下高嶋橋	市道山84号高嶋・綾杉線	綺田小字高島5-3	PC橋	10.5	2.6	1984	2021	Ⅱ	点検					点検	対策(床版（PC）)	対策(主桁（PC）)			1,153	
224	すいどう橋	市道木232号管路西線	吐師宮ノ前59-3	PC橋	10.6	4.4	1976	2021	Ⅱ	点検 対策(下部工（コンクリート）)					点検	対策(床版（PC）)	対策(主桁（PC）)			2,380	
225	山際橋	市道加2127号線	加茂町観音寺南貝戸	PC橋	10.6	5.2	1999	2021	Ⅰ	点検					点検					604	
226	平田橋	市道加2060号線	加茂町観音寺小松本	PC橋	10.8	5.2	2000	2021	Ⅱ	点検	対策(主桁（PC）)				点検	対策(床版（PC）)				1,350	

様式1-2
対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期および修繕内容・時期又は架替時期

橋梁ID	橋梁名	路線名	所在地	橋種	橋長	幅員	架設年度	最新点検年次	最新健全度	対策の内容・時期										全体事業費（概算）千円	備考
										2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035		
227	菩提橋	市道木337号木津南北線	城山台十三丁目	鋼橋	10.9	15.7	1994	2023	Ⅱ			点検				対策(床版（RC）)	点検 対策(主桁（鋼）)			13,813	
228	下荒渕橋	市道木25号長城谷身増線	市坂寒谷4	鋼橋	11.0	1.7	1973	2021	Ⅱ	点検 対策(鋼製支承)					点検	対策(床版（RC）)	対策(主桁（鋼）)			5,245	
229	中道橋	市道木159号吐師菅井線	吐師宮ノ前63-10	PC橋	11.0	6.8	1975	2021	Ⅱ	点検					点検	対策(床版（PC）)	対策(主桁（PC）)			1,475	
230	稲葉橋	市道山102号稲葉線	大字神童子小字稲葉84	PC橋	11.0	4.0	1976	2021	Ⅱ	点検					点検	対策(床版（PC）)	対策(主桁（PC）)			1,283	
231	岡田橋	市道加1-5号線	加茂町北	PC橋	11.0	3.5	1966	2021	Ⅰ	点検					点検					604	
232	1078号線1号橋	市道加1078号線	加茂町岡崎的場	鋼橋	11.2	3.6	1981	2021	Ⅱ	点検				対策(鋼製支承)	点検		対策(主桁（鋼）)			8,319	
233	満田橋	市道加1-7号線	加茂町兎並	PC橋	11.3	3.7	1972	2021	Ⅰ	点検					点検					604	
234	1079号線1号橋	市道加1079号線	加茂町岡崎的場	PC橋	11.3	2.6	1981	2021	Ⅱ	点検					点検	対策(床版（PC）)	対策(主桁（PC）)			1,203	
235	阿彌陀橋	市道加3043号線	加茂町駅東４丁目	PC橋	11.4	2.0	1971	2021	Ⅱ	点検 対策(下部工（コンクリート）)					点検					307	
236	1-4号線2号橋	市道加1-4号線	加茂町岡崎	PC橋	11.4	6.4	1996	2021	Ⅰ	点検					点検					604	
237	初谷奥橋	市道山50号平尾・奥山線	平尾初谷43	PC橋	11.5	3.1	1977	2021	Ⅱ	点検 対策(下部工（コンクリート）)					点検					309	
238	新川橋(加3047号)	市道加3047号線	加茂町北	PC橋	11.5	3.8	1961	2021	Ⅰ	点検					点検					604	
239	薬師橋	市道加1-6号線	加茂町北地先	RC橋	11.6	4.6	1960	2020	Ⅱ					点検			対策(主桁（RC）)		点検	1,302	
240	光明仙橋	市道山19号綺田・奥山線	綺田光明仙36-1	PC橋	12.0	4.0	1976	2021	Ⅰ	点検					点検					604	
241	岩ノ谷橋	市道山19号綺田・奥山線	綺田車谷112	PC橋	12.2	4.1	1976	2021	Ⅰ	点検					点検					604	
242	西垣内高架橋	市道山135号中垣内東線	山城町椿井	鋼橋	12.3	2.7	1984	2022	Ⅱ		点検					点検 対策(床版（RC）)	対策(鋼製支承) 対策(主桁（鋼）)			11,495	
243	出合橋	市道木157号上村新田線	吐師	PC橋	12.5	4.7	1974	2023	Ⅱ			点検				対策(床版（PC）)	点検			1,147	
244	石塚橋	市道木240号相楽柿ヶ坪石塚線	相楽	PC橋	12.5	3.7	1981	2023	Ⅱ			点検		対策(下部工（コンクリート）)		対策(床版（PC）)	点検			1,157	
245	山松川2号橋	市道木127号石塚六本木線	木津石塚	PC橋	12.5	3.7	1981	2022	Ⅱ		点検					点検 対策(床版（PC）)				839	
246	藤木小橋	市道木176号北之庄吐師線	吐師久保下	PC橋	12.5	4.7	1974	2022	Ⅱ	対策(下部工（コンクリート）)	点検					点検 対策(床版（PC）)				851	
247	天神小橋	市道山22号中浜・浜線	大字綺田大字中浜	鋼橋	12.5	3.7	1978	2022	Ⅱ		点検 対策(鋼製支承) 対策(下部工（コ					点検 対策(床版（RC）)	対策(主桁（鋼）)			7,818	
248	平尾橋	市道山47号綾杉・北河原線	平尾小字綾杉河原	PC橋	12.5	5.0	1986	2022	Ⅱ		点検					点検			対策(下部工（コンクリート）)	619	
249	初谷口橋	市道山50号平尾・奥山線	山城町平尾初谷	PC橋	12.5	3.1	1977	2022	Ⅰ		点検					点検				604	
250	灯明寺橋	市道加1-7号線	加茂町兎並	PC橋	12.5	4.8	1972	2022	Ⅱ		点検					点検 対策(床版（PC）)				839	
251	大正橋	市道木216号中ノ島五丁目線	木津町内垣外	鋼橋	12.6	6.3	1952	2022	Ⅱ		点検					点検				604	
252	1-1号線1号橋	市道加1-1号線	加茂町岡崎	PC橋	12.7	8.1	1991	2022	Ⅰ		点検					点検				768	
253	城戸橋	市道木105号宮ノ内線	木津宮ノ内	PC橋	12.8	6.2	2007	2022	Ⅰ		点検					点検		対策(主桁（PC）)		1,034	
254	山松川1号橋	市道木109号門樋曽根山線	木津小釜	PC橋	13.0	3.7	1981	2022	Ⅰ		点検					点検				604	

様式1-2
対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期および修繕内容・時期又は架替時期

橋梁ID	橋梁名	路線名	所在地	橋種	橋長	幅員	架設年度	最新点検年次	最新健全度	対策の内容・時期										全体事業費（概算）千円	備考
										2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035		
255	本谷橋	市道山19号綺田・奥山線	綺田本谷	PC橋	13.0	3.6	1978	2022	Ⅱ		点検					点検 対策(床版（PC）)	対策(主桁（PC）)			1,088	
256	天神出垣外橋	市道山27号出垣外・局塚線	綺田戸田家	PC橋	13.0	1.1	1967	2022	Ⅰ		点検					点検				604	
257	外高島北橋	市道山46号高嶋線	綺田小字外高島	PC橋	13.0	7.2	1990	2022	Ⅱ		点検					点検	対策(主桁（PC）)			2,090	
258	小川中橋	市道木152号小川川端線	木津川端	PC橋	13.2	5.0	1987	2022	Ⅰ		点検					点検				604	
259	極楽橋(木67号)	市道木67号瓦谷泉橋線	木津西垣外	PC橋	13.7	8.2	2005	2022	Ⅰ		点検					点検				768	
260	不動橋(山50号)	市道山50号平尾・奥山線	平尾笛吹	PC橋	13.7	4.1	1974	2022	Ⅱ		点検					点検 対策(床版（PC）)				891	
261	京橋(山60号)	市道山60号東古川・神童子線	山城町神童子稲葉	PC橋	14.0	3.2	1977	2022	Ⅱ		点検					点検	対策(主桁（PC）)			819	
262	渋谷川橋	市道木464号大里相楽台線	相楽台4丁目	PC橋	14.1	7.4	1984	2022	Ⅰ		点検					点検				604	
263	中ノ橋	市道木234号中ノ島3号線	木津川端	PC橋	14.6	7.2	1973	2022	Ⅱ	対策(下部工（コンクリート）)	点検					点検 対策(床版（PC）)	対策(主桁（PC）)			3,446	
264	大川橋	市道山128号水垣内・三階線	椿井水垣内	PC橋	14.8	6.1	1979	2022	Ⅱ		点検	対策(下部工（コンクリート）)				点検	対策(主桁（PC）)			1,688	
265	糠田橋	市道木215号久保川南線	市坂久保川	PC橋	15.0	12.8	2007	2022	Ⅱ		点検			対策(床版（PC）)		点検		対策(主桁（PC）)		8,045	
266	小寺橋	市道木103号小寺五丁目線	木津内垣外	鋼橋	15.0	3.6	1967	2022	Ⅰ		点検					点検				604	
267	天神下橋	市道山46号高嶋線	山城町綺田小坪	PC橋	15.0	4.6	1972	2024	Ⅱ	対策(下部工（コンクリート）)			点検			対策(床版（PC）)		点検		2,933	
268	高島橋	市道山85号高嶋・綾杉河原線	山城町椅田高島4	RC橋	15.0	3.6	1980	2024	Ⅱ				点検				対策(主桁（RC）)	点検		1,808	
269	泉橋	市道木216号中ノ島五丁目線	木津町内垣内外11	PC橋	15.1	6.8	1977	2024	Ⅲ	対策(下部工（コンクリート）)			点検			対策(床版（PC）)	対策(主桁（PC）)	点検		5,512	
270	石川橋	市道山103号神童子線	山城町神童子横峰	PC橋	15.2	7.5	1989	2024	Ⅰ				点検					点検		734	
271	古川橋	市道木193号相楽金龍線	相楽古川	PC橋	16.5	3.1	1954	2022	Ⅱ		点検					点検 対策(床版（PC）)	対策(主桁（PC）)			3,402	
272	荒神橋	市道木241号相楽姫子古川線	相楽姫子	PC橋	16.6	4.8	1955	2022	Ⅱ		点検					点検 対策(床版（PC）)	対策(主桁（PC）)			4,994	
273	寒谷橋	市道木142号向山梅谷線	市坂寒谷	PC橋	17.4	4.8	1999	2022	Ⅰ		点検					点検				734	
274	藤木橋	市道木181号北之庄菅井線	吐師柳原	PC橋	17.5	3.7	1973	2022	Ⅱ		点検					点検 対策(床版（PC）)	対策(主桁（PC）)			4,145	
275	京奈和側道2号橋	市道木511号京奈和側道2号線	相楽熊野田	PC橋	17.8	7.2	2001	2022	Ⅰ		点検					点検				734	
276	山松川5号橋	市道木124号小釜・芝ノ鼻線	木津小釜	PC橋	18.2	3.7	1975	2022	Ⅱ		点検					点検	対策(主桁（PC）)			2,472	
277	天神橋	市道山20号渋川・山口線	山城町綺田北村	PC橋	18.3	6.2	1980	2024	Ⅱ				点検				対策(主桁（PC）)	点検		3,028	
278	上大城橋	市道木110号門樋・水干線	市坂古川	PC橋	18.6	4.3	1981	2022	Ⅰ		点検					点検				734	
279	加茂橋	市道木126号中山相楽線	市坂古川	PC橋	18.6	4.3	1981	2022	Ⅱ		点検					点検 対策(床版（PC）)	対策(主桁（PC）)			5,188	
280	鹿川8号橋	市道木110号門樋・水干線	木津西小林	PC橋	18.6	4.0	1975	2022	Ⅰ		点検					点検				734	
281	鹿川3号橋	市道木110号門樋・水干線	市坂芝ノ鼻	PC橋	18.6	4.0	1975	2022	Ⅱ	対策(下部工（コンクリート）)	点検					点検	対策(主桁（PC）)			2,674	
282	鹿川2号橋	市道木122号加茂田・一丁田線	市坂壱丁田	PC橋	18.6	4.0	1975	2022	Ⅰ		点検					点検				734	

様式1-2
対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期および修繕内容・時期又は架替時期

橋梁ID	橋梁名	路線名	所在地	橋種	橋長	幅員	架設年度	最新点検年次	最新健全度	対策の内容・時期										全体事業費（概算）千円	備考
										2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035		
283	鹿川7号橋	市道木110号門樋・水干線	木津田中前	PC橋	18.7	4.0	1975	2022	Ⅱ	対策(下部工（コンクリート）)	点検					点検	対策(主桁（PC）)			2,687	
284	東中央線4号橋	市道木800号東中央線	市坂井後間	PC橋	18.9	9.1	1996	2019	Ⅱ				点検					点検		1,076	
285	東中央側道1号線2号橋	市道木850号東中央側道1号線	市坂井後間	PC橋	18.9	9.3	1996	2019	Ⅱ				点検					点検		1,076	
286	東中央側道2号線1号橋	市道木851号東中央側道2号線	市坂井後間	PC橋	18.9	9.3	1996	2019	Ⅱ				点検					点検		1,076	
287	豊楽橋(木335号)	市道木335号木津山田川線	木津神田	PC橋	19.0	12.8	1993	2024	Ⅱ				点検			対策(床版（PC）)	対策(主桁（PC）)	点検		16,269	
288	京奈和側道1号橋	市道木850号京奈和側道1号線	相楽熊野田	PC橋	19.9	7.2	2001	2022	Ⅰ		点検					点検				734	
289	解放橋	市道加1-5号線	加茂町北	PC橋	20.0	4.0	1970	2024	Ⅰ				点検					点検		22,000	
290	鳴子下橋	市道山47号綾杉・北河原線	山城町平尾西方儀7	PC橋	20.3	4.7	1980	2023	Ⅱ			点検					点検 対策(主桁（PC）)			2,308	
291	新天神橋	市道木86号岡田国神社馬場道線	木津奈良道	PC橋	20.4	5.2	1988	2022	Ⅱ		点検					点検				734	
292	豊楽橋(木91号)	市道木91号鹿背山北之庄線	木津内垣外112	鋼橋	20.5	9.0	1965	2020	Ⅱ					点検					点検	968	
293	鳴子橋	市道山230号北代・東黒部線	山城町平尾東方儀	RC橋	20.6	5.1	1955	2023	Ⅱ			点検					点検 対策(主桁（RC）)			2,892	
294	美濃谷口橋	市道山50号平尾・奥山線	山城町平尾	PC橋	20.6	5.0	1993	2023	Ⅰ			点検					点検			984	
295	灯篭寺橋	市道木43号西垣外加茂線	山城町平尾西方儀7	PC橋	20.7	7.2	1998	2023	Ⅱ	対策(主桁（PC）)		点検					点検			4,033	
296	白口橋	市道木91号鹿背山北之庄線	木津白口	PC橋	20.7	12.8	1998	2020	Ⅱ	対策(主桁（PC）)				点検		対策(床版（PC）)			点検	17,257	
297	不動中橋	市道山35号山口・中古川線	山城町平尾中古川	PC橋	21.5	4.7	1976	2023	Ⅱ			点検				対策(床版（PC）)	点検			4,131	
298	不動下橋	市道山46号高嶋線	山城町綺田高島	PC橋	22.6	4.7	1972	2023	Ⅱ			点検				対策(床版（PC）)	点検 対策(主桁（PC）)			6,917	
299	大野橋	市道加2-10号線	加茂町大野	PC橋	22.9	4.8	1974	2023	Ⅰ			点検					点検			1,074	
300	北原橋	市道山101号大平尾・神童子線	山城町神童子北原55	PC橋	23.3	6.8	1972	2023	Ⅱ			点検					点検 対策(主桁（PC）)			3,645	
301	釜ヶ谷橋	市道木466号鹿背山宮ノ裏線	鹿背山当田	PC橋	23.7	7.2	1997	2022	Ⅱ		点検					点検				1,234	
302	北河原橋	市道山111号北河原・中道線	山城町平尾西黒部46	PC橋	25.0	4.7	1975	2023	Ⅱ	対策(下部工（コンクリート）)		点検				対策(床版（PC）)	点検			3,567	
303	天神高架橋	市道山17号天神北線	山城町綺田	RC橋	25.3	4.6	1957	2022	Ⅱ		点検					点検				910	
304	農道橋	市道加2057号線	加茂町大野五ノ坪	鋼橋	25.5	3.2	1971	2023	Ⅱ	対策(鋼製支承) 対策(下部工（コンクリート）)		点検				対策(床版（RC）)	点検 対策(主桁（鋼）)			15,813	
305	山桜2号歩道橋	市道木774号山桜の道	相楽台2丁目	PC橋	26.0	3.9	1987	2023	Ⅱ			点検					点検 対策(主桁（PC）)			2,579	
306	田中橋	市道木185号瓦谷片田線	木津神田55	PC橋	26.8	5.0	1980	2023	Ⅱ			点検				対策(床版（PC）)	点検 対策(主桁（PC）)			6,493	
307	大阪橋(木335号)	市道木335号木津山田川線	木津神田	PC橋	27.0	7.3	1975	2024	Ⅱ	対策(下部工（コンクリート）)			点検				対策(主桁（PC）)	点検		5,545	
308	大阪橋歩道橋	市道木335号木津山田川線	木津南後背	鋼橋	27.0	3.3	1980	2024	Ⅱ				点検 対策(鋼製支承)			対策(床版（RC）)	対策(主桁（鋼）)	点検		17,108	
309	赤松歩道橋	市道木770号赤松の道	兜台2丁目	PC橋	27.0	3.9	1988	2020	Ⅱ					点検			対策(主桁（PC）)		点検	3,114	
310	金龍橋	市道木193号相楽金龍線	相楽古川	PC橋	27.8	6.0	1983	2022	Ⅱ		点検					点検 対策(下部工（コンクリート）)				470	

対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期および修繕内容・時期又は架替時期

橋梁ID	橋梁名	路線名	所在地	橋種	橋長	幅員	架設年度	最新点検年次	最新健全度	対策の内容・時期										全体事業費（概算）千円	備考
										2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035		
311	京内橋	市道加4020号線	南加茂台9	鋼橋	28.0	15.8	1977	2023	Ⅱ	対策(鋼製支承) 対策(下部工（コンクリート）)		点検				対策(床版（RC）)	点検 対策(主桁（鋼）)			57,059	
312	新川第二橋	市道木182号上河原線	吐師上河原	鋼橋	28.0	2.2	1981	2022	Ⅱ		点検			対策(鋼製支承) 対策(下部工（コンクリート）)		点検	対策(主桁（鋼）)			13,046	
313	大阪橋(木91号)	市道木91号鹿背山北之庄線	京都府木津字神田4-2	PC橋	28.8	8.0	1974	2020	Ⅱ					点検			対策(主桁（PC）)		点検	7,165	
314	新川橋(加3008号)	市道加3008号線	加茂町北鴨村17	鋼橋	30.0	9.8	1979	2023	Ⅱ			点検 対策(鋼製支承) 対策(下部工（コンクリート）)				対策(床版（RC）)	点検 対策(主桁（鋼）)			46,940	
315	木津川台第3跨道橋	市道木602号木津川台通り7号線	木津川台2丁目11	PC橋	31.2	4.8	1990	2020	Ⅱ					点検			対策(主桁（PC）)		点検	4,082	
316	姫子橋	市道木409号相楽吐師線	相楽姫子	鋼橋	31.2	14.4	1979	2024	Ⅰ				点検					点検		1,546	
317	清水橋	市道木176号北之庄吐師線	相楽清水	PC橋	31.9	5.0	1983	2024	Ⅰ				点検					点検		1,280	
318	泉小橋	市道木91号鹿背山北之庄線	木津町内垣内外11	PC橋	32.2	8.3	1973	2021	Ⅱ	点検					点検	対策(床版（PC）)	対策(主桁（PC）)			11,983	
319	東西幹線歩道橋	市道木777号兜台歩29号線	兜台6丁目	PC橋	33.5	3.9	1986	2023	Ⅱ			点検					点検		対策(主桁（その他）) 対策(下部工（コンクリート）)	19,209	
320	エゴノキ2号歩道橋	市道木771号エゴノキの道	相楽台7丁目	PC橋	33.8	3.9	1989	2023	Ⅱ			点検					点検 対策(主桁（PC）)			2,985	
321	曽根山緑地2号橋	市道木807号相楽台歩25号線	相楽台5丁目15	PC橋	37.7	3.8	2000	2020	Ⅱ					点検		対策(主桁（その他）)			点検	17,667	
322	曽根山緑地1号橋	市道木792号相楽台歩11号線	相楽台6丁目9	PC橋	38.6	5.2	2000	2020	Ⅰ					点検					点検	1,108	
323	不動橋(加2-1号)	市道加2-1号線	加茂町奥畑土々平	RC橋	40.0	4.1	1958	2022	Ⅱ		点検					点検	対策(主桁（RC）)			6,351	
324	山桜1号歩道橋	市道木774号山桜の道	兜台6丁目	PC橋	40.0	3.9	1985	2023	Ⅱ			点検					点検	対策(下部工（コンクリート）)	対策(主桁（その他）)	24,253	
325	ニセアカシア1号歩道	市道木376号ニセアカシアの道	兜台7丁目	PC橋	44.0	3.9	1985	2020	Ⅱ					点検			対策(主桁（PC）)	対策(下部工（コンクリート）)	点検	7,556	
326	城下橋	市道木335号木津山田川線	相楽城下	PC橋	46.0	8.0	1985	2022	Ⅱ		点検					点検 対策(床版（PC）)	対策(主桁（PC）)	対策(下部工（コンクリート）)		25,457	
327	ニセアカシア2号歩道	市道木376号ニセアカシアの道	相楽台1丁目	PC橋	46.9	3.9	1988	2020	Ⅱ					点検		対策(床版（PC）)	対策(主桁（PC）)		点検	9,152	
328	東西幹線1号橋	市道木331号東西幹線1号線	相楽台３丁目１	PC橋	54.0	14.8	1984	2021	Ⅱ	点検					点検	対策(床版（PC）)	対策(主桁（PC）) 対策(下部工（コンクリート）)			46,717	
329	木津川台第2跨道橋	市道木596号木津川台通り3号線	木津川台3丁目18-10	PC橋	55.0	5.3	1990	2020	Ⅰ					点検					点検	1,288	
330	木津川台第1跨道橋	市道木600号木津川台2-1号線	木津川台3丁目30	PC橋	55.7	14.6	2001	2020	Ⅱ					点検			対策(主桁（その他）)		点検	78,756	
331	木津川台歩道橋	市道木693号木津川台歩2-16号線	木津川台	PC橋	57.0	2.0	1990	2022	Ⅱ		点検					点検	対策(主桁（PC）)			3,145	
332	下河原橋	市道木199号曽根山大里東線	木津下河原	PC橋	58.9	7.2	1979	2022	Ⅰ		点検					点検				1,280	
333	山桃歩道橋	市道木772号山桃の道	相楽台6丁目	PC橋	60.0	3.9	1987	2023	Ⅱ			点検					点検			962	
334	水分橋	市道木27号木津中ノ川線	山城町平尾西方儀7	鋼橋	62.5	14.3	1995	2021	Ⅱ	点検					点検					1,392	
335	州見橋1号橋	市道木800号東中央線	州見台3丁目	PC橋	67.5	16.6	1994	2020	Ⅱ					点検			対策(主桁（PC）)		点検	23,954	
336	州見橋2号橋	市道木800号東中央線	州見台3丁目	PC橋	67.5	19.6	1994	2020	Ⅱ					点検			対策(主桁（PC）)		点検	27,157	
337	椎の木歩道橋	市道木782号相楽台歩1号線	相楽台２丁目19	PC橋	71.8	4.3	1986	2021	Ⅱ	点検					点検	対策(床版（PC）)	対策(主桁（PC）)		対策(下部工（コンクリート）)	20,570	
338	エゴノキ1号歩道橋	市道木771号エゴノキの道	相楽台１丁目5	PC橋	85.2	5.8	1985	2021	Ⅱ	点検					点検	対策(床版（PC）)	対策(主桁（PC）)	対策(下部工（コンクリート）)		34,542	

対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期および修繕内容・時期又は架替時期

橋梁ID	橋梁名	路線名	所在地	橋種	橋長	幅員	架設年度	最新点検年次	最新健全度	対策の内容・時期										全体事業費（概算）千円	備考
										2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035		
339	東中央線3号橋	市道木800号東中央線	大路市坂小字井後間	PC橋	98.3	9.1	1996	2020	Ⅱ					点検		対策(床版(PC))	対策(主桁(PC))		点検	36,534	
340	東中央側道1号線1号橋	市道木850号東中央側道1号線	大路市坂小字井後間	PC橋	99.4	9.3	1996	2020	Ⅱ					点検		対策(床版(PC))	対策(主桁(PC))		点検	36,299	
341	東中央側道2号線2号橋	市道木851号東中央側道2号線	大路市坂小字井後間	PC橋	106.4	10.5	1996	2020	Ⅱ					点検		対策(床版(PC))			点検	20,595	
342	東中央線2号橋	市道木800号東中央線	市坂弓田	鋼橋	107.4	6.6	1996	2020	Ⅱ					点検		対策(床版(RC))			点検	25,459	
343	東中央線1号橋	市道木800号東中央線	大字市坂小字堂田	鋼橋	309.9	8.1	1997	2020	Ⅱ	対策(主桁(鋼))				点検		対策(床版(RC))			点検	276,405	
344	井平尾農道橋	市道加1092号線	加茂町井平尾吉原	PC橋	23.8	3.5	2010	2023	Ⅰ			点検					点検 対策(床版(PC))			2,757	
345	四ツ池幹線歩道橋	市道木413号木津川台3号線	木津川台3丁目	PC橋	72.4	2.4	1990	2023	Ⅱ			点検					点検 対策(主桁(PC))			4,145	
346	野日代橋	市道山287号上狛・椿井線	山城町上狛	RC橋	3.5	7.6	1933	2024	Ⅲ	対策(主桁(RC))			点検					点検		1,220	
347	宮白橋	市道木892号木津鹿背山線	城山台一丁目	PC橋	22.1	11.0	1995	2019	Ⅱ				点検			対策(床版(PC))	対策(主桁(PC))	点検		10,502	
348	幣羅坂橋	市道木893号木津市坂線	州見台三丁目	その他	2.4	13.7	1990	2024	Ⅰ				点検					点検		2,030	
349	無名橋4	市道木892号木津鹿背山線	木津駅前一丁目	RC橋	4.5	13.0	1945	2018	Ⅱ			点検					点検 対策(主桁(RC))			925	
350	03_047_002号BOX	市道木892号木津鹿背山線	木津駅前一丁目	その他	3.0	30.0	1993	2018	Ⅱ	対策(主桁（その他）)		点検					点検			1,104	
377	木津鹿背山線1号橋	市道木892号木津鹿背山線	木津雲村	その他	5.3	12.2	1993	2024	Ⅰ				点検					点検		768	
378	鹿背山橋	市道木892号木津鹿背山線	鹿背山当田	PC橋	15.8	14.5	2019	2024	Ⅰ				点検					点検		768	
